



Mise à jour de Teamoty Scheduling du 25/11/2022

Bonjour, une nouvelle version de Teamoty Scheduling est en ligne.  
Vous trouverez dans ce document un résumé des différentes évolutions.


## Work Package

Une nouvelle fonctionnalité est disponible, appelée « work package » :


Un work package est comme une sous séquence dans la séquence. Elle permet de matérialiser qu'un ensemble de tâche ne peut changer de zone que quand celui-ci est terminé dans son intégralité dans la zone d'avant, L'idée est de devoir réaliser l'ensemble de ces tâches sur une zone avant d'enchaîner sur la zone qui suit;

### Par exemple :

Flux classique avec taches classiques :

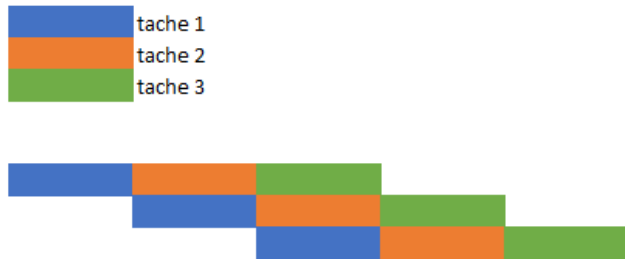

Work Package avec ces mêmes tâches

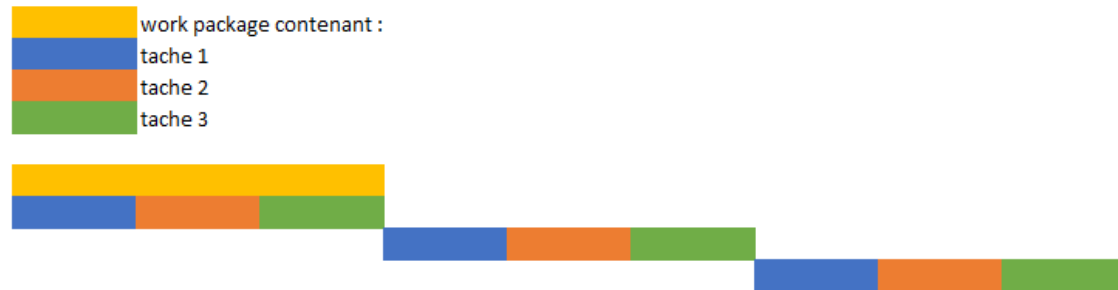

## Work Package

Dorénavant vous pouvez créer un nouveau type de tâche dans l'édition des tâches : le Work Package



Ce type de tâche va vous permettre de regrouper et lier plusieurs « sous-tâches ». Le work package est donc potentiellement un ensemble de tâches ;

Il est nécessaire de renseigner à minima un nom, un code, un lot, une durée minimale et un effectif :

### Editer un workpackage : workpackage (wk)

Couleur ▼	Famille de tâche Nouvelle famille ▼	Nom de la tâche tache 1	Code T1
--------------	--	----------------------------	------------

Identification de la tâche	Microtâche	Prédécesseur	Successeur
<div>Lot Sélectionnez un lot ▼</div> <div>Durée minimale 1 Jours</div> <div>Effectif (Personnes par équipe) 1</div>			

Périodicité  
5 jours/semaine ▼

Nombre de jours d'attente  
0


Mode de jours  
Ouvré ▼

Ajouter des tags

## Work Package

En cliquant sur Valider et continuer, vous entrez dans la gestion des tâches de ce work package, avec le choix de types de tâches existants à ce jour :

### Gestion des tâches workpackage : tache 1



Vous pouvez alors créer les tâches qui composeront ce work package. Un work package peut être créé sans « sous-tâche » puis renseigné plus tard dans la vie de votre planning.


**Attention, les notions de Nombre d'équipes et de Quantité/Unité de travail n'existent pas, seuls la durée et l'effectif sont ici considérés !**

Dans l'onglet SEQUENCES, vous retrouvez en plus de vos séquences habituelles, une section Work Package, avec les tâches de type Work Package créées :

Work Package					
✓	T1	tache 1	21	3	21/11/2022

## Work Package

Exemple de Work Package :

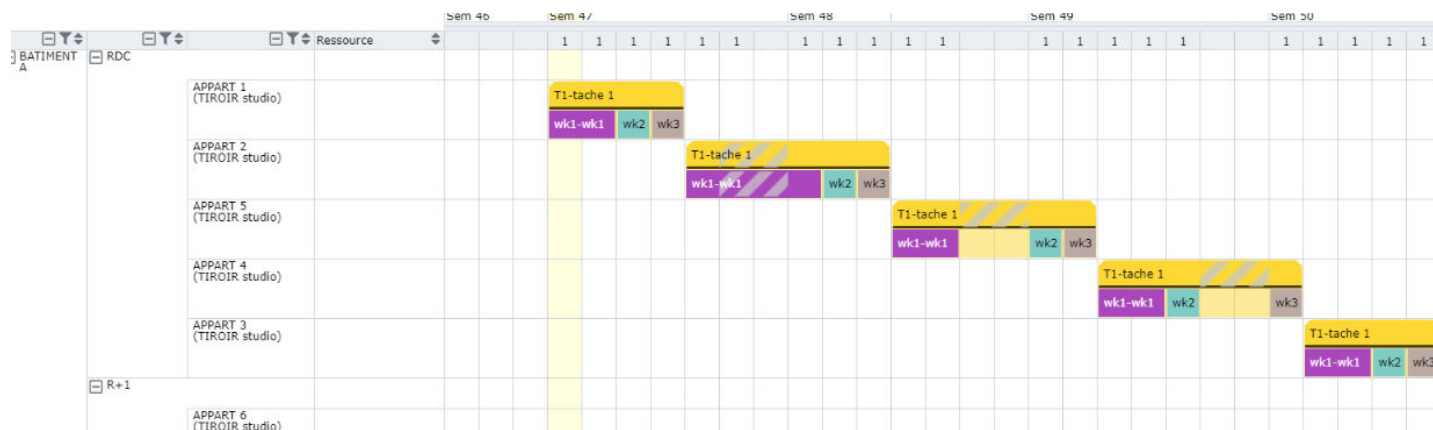


En jaune le nom et le code de la tâche « WORK PACKAGE » puis en dessous, le détail des tâches qui le constituent.

Le fonctionnement de ces tâches est classique, elles sont pointables et visibles en version mobile. Un Work Package sans tâches est également pointable.


## Work Package

Dans l'onglet Filtre des tâches dans le planning, vous pouvez décider d'afficher uniquement la tâche work package (jaune) ou le détail des tâches du work package, et également afficher le détail sur la première zone et masquer pour les autres :

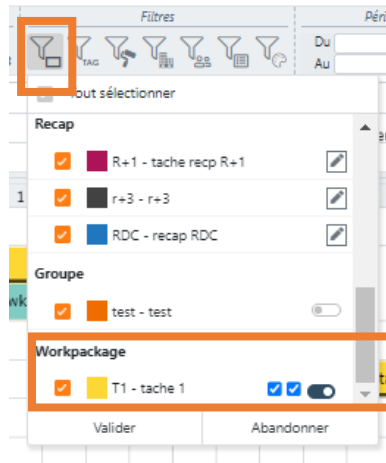

Lorsque vous positionnez le curseur sur les coches, la fonctionnalité s'affiche :

En désactivant la première coche vous obtenez ce visuel :

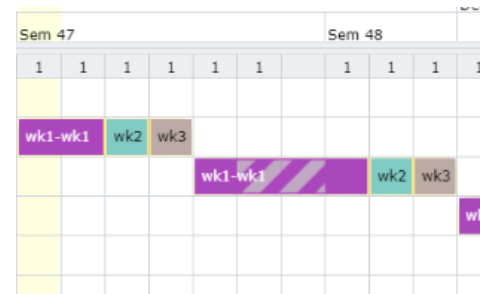

Exemple d'utilisation : travaux de façade.

Les tâches à l'intérieur d'un WP ont les caractéristiques habituelles. Il est donc possible de réaliser des liens à la tâche / Micro-tâche.

La durée d'un WP s'étend en fonction de la durée des tâches qui le compose



Merci pour votre attention.
